Messprotokoll Leistungskurve IB-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 05:41 · Messung am 05.11.2026 · Sollkurve aus B-002

Leistung P in kW über Wind v in m/s – Linie: Rechnung, Punkte: Messung

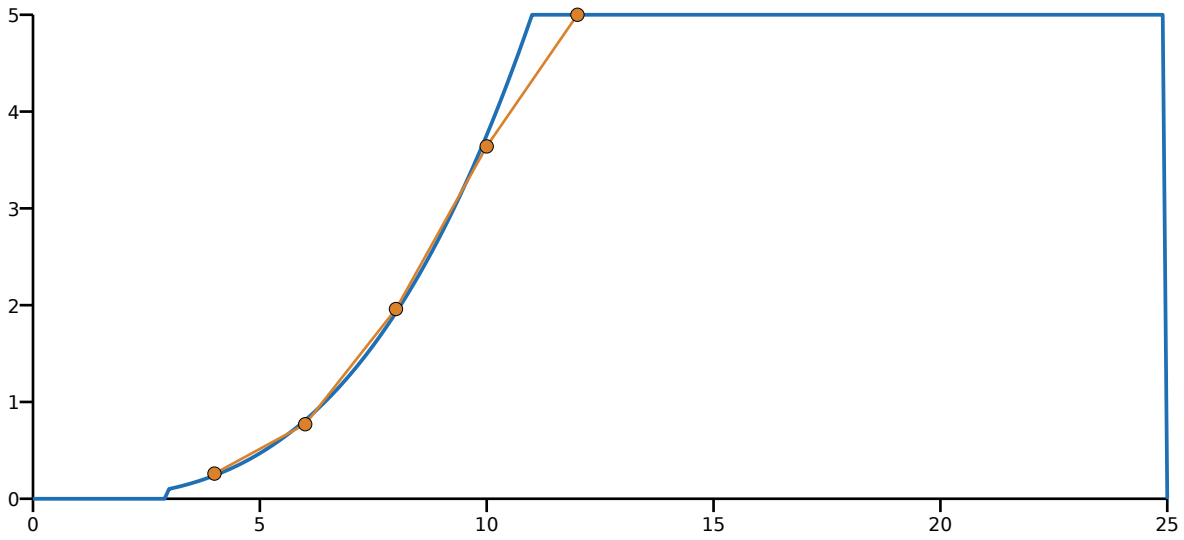

v in m/s	P gemessen kW	P Rechnung kW	Abweichung	Ergebnis
4	0,26	0,2404	8,14 %	i. O.
6	0,77	0,8114	-5,1 %	i. O.
8	1,96	1,923	1,9 %	i. O.
10	3,64	3,757	-3,1 %	i. O.
12	5	5	0 %	i. O.

Toleranz ±15 % (Richtwert). Vereinfachte Messung (Mittelwerte je Windklasse); eine normgerechte Messung nach IEC 61400-12-1 braucht einen Messmast und längere Messdauer.
