
Zeitplan

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 05:54 · Stichtag 03.12.2026

P1 Ideenfindung	**P2** Anforderungen	**P3** Konzept	**P4** Berechnung & Auslegung	**P5** Konstruktion (CAD)	**P6** Fertigung	**P7** Montage	**P8** Inbetriebnahme	**P9** Betrieb
100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

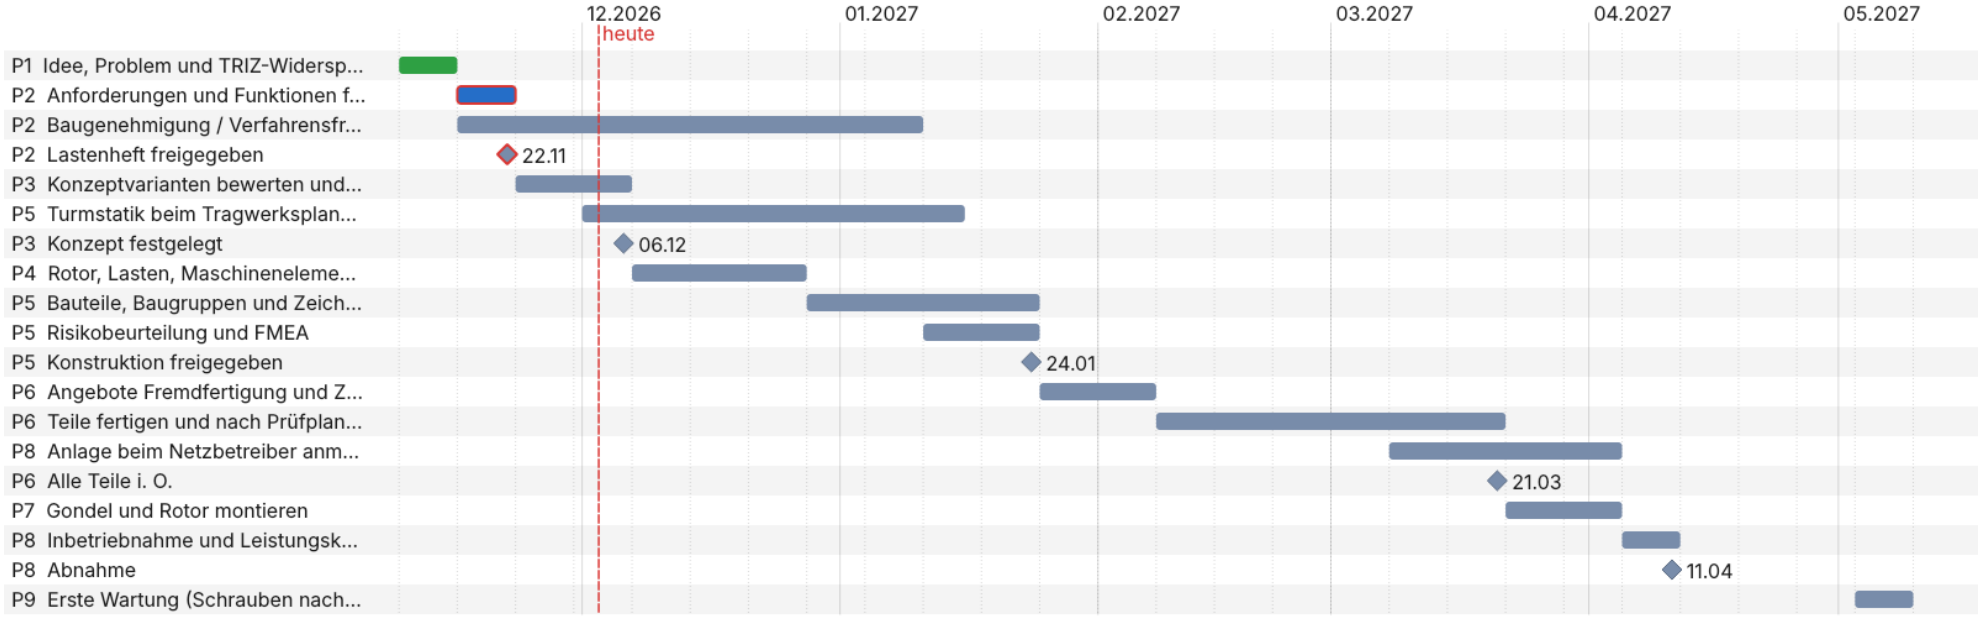

Aufgaben und Meilensteine

Nr	Aufgabe	Phase	Wer	Zeitraum	Stand	Objekt	Notiz
AU-001	Idee, Problem und TRIZ-Widersprüche festhalten	P1	Yamine	09.11.2026 – 15.11.2026	erledigt		Dauer Schätzwert
AU-002	Anforderungen und Funktionen festlegen	P2		16.11.2026 – 22.11.2026	in Arbeit (11 Tage über Termin)		Dauer Schätzwert
AU-004	Baugenehmigung / Verfahrensfreiheit bei der Gemeinde klären	P2		16.11.2026 – 10.01.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-003 ◆	Lastenheft freigegeben	P2		22.11.2026	offen (11 Tage über Termin)		Termin Schätzwert
AU-005	Konzeptvarianten bewerten und auswählen	P3		23.11.2026 – 06.12.2026	offen		Dauer Schätzwert

Nr	Aufgabe	Phase	Wer	Zeitraum	Stand	Objekt	Notiz
AU-019	Turmstatik beim Tragwerksplaner beauftragen	P5		01.12.2026 – 15.01.2027	offen	T-001	
AU-006 ◆	Konzept festgelegt	P3		06.12.2026	offen		Termin Schätzwert
AU-007	Rotor, Lasten, Maschinenelemente, Turm berechnen	P4		07.12.2026 – 27.12.2026	offen		Dauer Schätzwert
AU-008	Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen erstellen	P5		28.12.2026 – 24.01.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-010	Risikobeurteilung und FMEA	P5		11.01.2027 – 24.01.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-009 ◆	Konstruktion freigegeben	P5		24.01.2027	offen		Termin Schätzwert
AU-011	Angebote Fremdfertigung und Zukaufteile einholen	P6		25.01.2027 – 07.02.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-012	Teile fertigen und nach Prüfplan prüfen	P6		08.02.2027 – 21.03.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-015	Anlage beim Netzbetreiber anmelden	P8		08.03.2027 – 04.04.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-013 ◆	Alle Teile i. O.	P6		21.03.2027	offen		Termin Schätzwert
AU-014	Gondel und Rotor montieren	P7		22.03.2027 – 04.04.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-016	Inbetriebnahme und Leistungskurve messen	P8		05.04.2027 – 11.04.2027	offen		Dauer Schätzwert
AU-017 ◆	Abnahme	P8		11.04.2027	offen		Termin Schätzwert
AU-018	Erste Wartung (Schrauben nachziehen)	P9		03.05.2027 – 09.05.2027	offen		Dauer Schätzwert

Dauern der Vorlage sind Schätzwerte für ein Ein-Personen-Projekt nach Feierabend – an die eigene Zeit anpassen. Fortschritt je Phase = Anteil erledigter Aufgaben und geprüfter/freigegebener Objekte; eine freigegebene Phase zählt 100 %.
